

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	**I. DEFINIR — Semanas 1 a 3**	**21 días**	**lun 17/08/26**	**dom 06/09/26**		
2	**SEMANA 01 — Inicio, equ**	**7 días**	**lun 17/08/26**	**dom 23/08/26**		
3	Conformar equipo, asi	1 día	lun 17/08/26	lun 17/08/26		SR[50%];GM[50%];LC[50%];
4	Crear carpetas, registi	2 días	mar 18/08/26	mié 19/08/26	3	SR[50%]
5	Levantar necesidad de	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/26	3	GM[50%]
6	Redactar Problem Sta	2 días	vie 21/08/26	sáb 22/08/26	5	GM[50%]
7	Revisar problema, alc	1 día	dom 23/08/26	dom 23/08/26	4;6	RP[50%]
8	HITO S01 — Entregal	0 días	dom 23/08/26	dom 23/08/26	7	RP[50%]
9	**SEMANA 02 — Investiga**	**7 días**	**lun 24/08/26**	**dom 30/08/26**		
10	Revisar fichas del bar	3 días	lun 24/08/26	mié 26/08/26	8	GM[50%]
11	Investigar hornos, cale	3 días	lun 24/08/26	mié 26/08/26	8	LC[50%]
12	Comparar alternativas	3 días	jue 27/08/26	sáb 29/08/26	10;11	GM[50%];LC[50%]
13	Registrar fuentes y co	6 días	lun 24/08/26	sáb 29/08/26	8	SR[50%]
14	Revisar benchmarking	1 día	dom 30/08/26	dom 30/08/26	12;13	RP[50%]
15	HITO S02 — Entregal	0 días	dom 30/08/26	dom 30/08/26	14	RP[50%]
16	**SEMANA 03 — Funcione**	**7 días**	**lun 31/08/26**	**dom 06/09/26**		
17	Definir FUN-01: funci	2 días	lun 31/08/26	mar 01/09/26	15	GM[50%]
18	Definir CES-01: criteri	2 días	mié 02/09/26	jue 03/09/26	17	GM[50%]
19	Elaborar concepto, ca	3 días	mié 02/09/26	vie 04/09/26	17	LC[50%]
20	Consolidar entregable	1 día	sáb 05/09/26	sáb 05/09/26	18;19	SR[50%]
21	Revisar y aprobar con	1 día	dom 06/09/26	dom 06/09/26	20	RP[50%]
22	HITO S03 — Entregal	0 días	dom 06/09/26	dom 06/09/26	21	RP[50%]
23	**II. DISEÑAR — Semanas 4 a 6**	**21 días**	**lun 07/09/26**	**dom 27/09/26**		
24	**SEMANA 04 — SRS y arc**	**7 días**	**lun 07/09/26**	**dom 13/09/26**		
25	Desarrollar SRS: requ	3 días	lun 07/09/26	mié 09/09/26	22	GM[50%]
26	Definir interfaces, requ	2 días	jue 10/09/26	vie 11/09/26	25	GM[50%];LC[50%]
27	Elaborar ARC-01 y AF	2 días	jue 10/09/26	vie 11/09/26	25	LC[50%]
28	Verificar trazabilidad fi	1 día	sáb 12/09/26	sáb 12/09/26	26;27	RP[50%]
29	Publicar revisión SRS	1 día	dom 13/09/26	dom 13/09/26	28	SR[50%]
30	HITO S04 — Entregal	0 días	dom 13/09/26	dom 13/09/26	29	RP[50%]

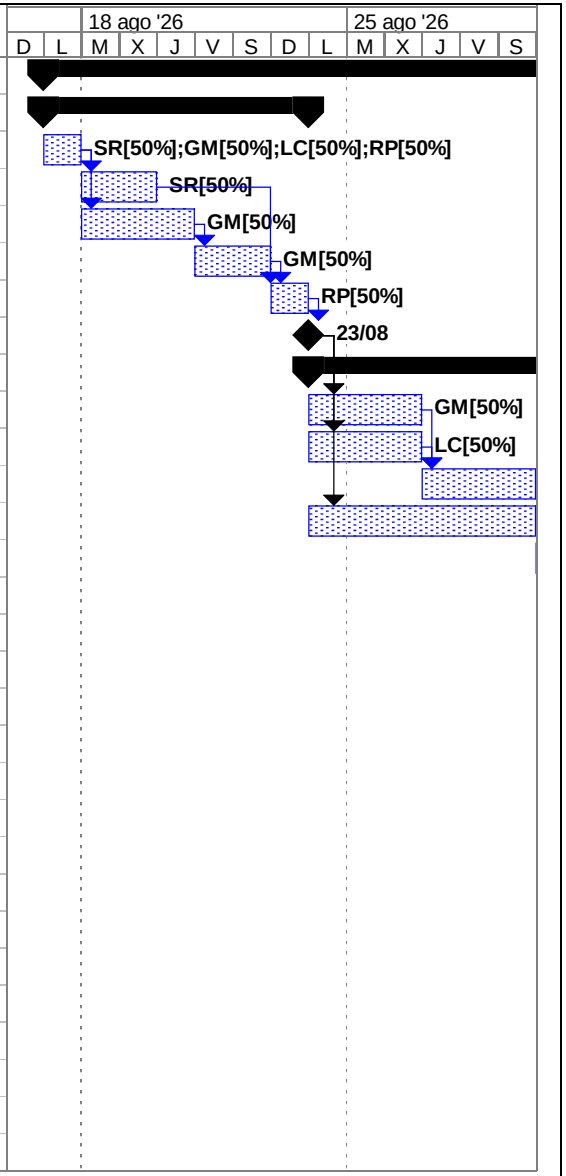

Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26

Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
31	**SEMANA 05 — Filosofía**	**7 días**	**lun 14/09/26**	**dom 20/09/26**		
32	Definir estados, permi	2 días	lun 14/09/26	mar 15/09/26	30	GM[50%];LC[50%]
33	Elaborar PFD actual y	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	32	LC[50%]
34	Elaborar P&ID y hoja	2 días	vie 18/09/26	sáb 19/09/26	33	LC[50%]
35	Revisar interfaces y s	1 día	dom 20/09/26	dom 20/09/26	34	RP[50%]
36	Consolidar memoria d	4 días	mié 16/09/26	sáb 19/09/26	32	SR[50%]
37	HITO S05 — Entregal	0 días	dom 20/09/26	dom 20/09/26	35;36	RP[50%]
38	**SEMANA 06 — Selección**	**7 días**	**lun 21/09/26**	**dom 27/09/26**		
39	Dimensionar prelimina	2 días	lun 21/09/26	mar 22/09/26	37	LC[50%]
40	Seleccionar PLC, HMI	2 días	mié 23/09/26	jue 24/09/26	39	LC[50%]
41	Seleccionar SSR, disi	1 día	vie 25/09/26	vie 25/09/26	40	LC[50%]
42	Consolidar BOM, prov	1 día	sáb 26/09/26	sáb 26/09/26	41	SR[50%];LC[50%]
43	Completar matriz de tr	2 días	vie 25/09/26	sáb 26/09/26	40	GM[50%]
44	Revisar viabilidad y lib	1 día	dom 27/09/26	dom 27/09/26	42;43	RP[50%]
45	HITO S06 — Entregal	0 días	dom 27/09/26	dom 27/09/26	44	RP[50%]
46	**III. INGENIERÍA — Semanas 7**	**21 días**	**lun 28/09/26**	**dom 18/10/26**		
47	**SEMANA 07 — Instrumer**	**7 días**	**lun 28/09/26**	**dom 04/10/26**		
48	Actualizar solución elé	2 días	lun 28/09/26	mar 29/09/26	45	GM[50%];LC[50%]
49	Definir TAG-01 y lista	2 días	mié 30/09/26	jue 01/10/26	48	LC[50%]
50	Desarrollar DWG-01:	2 días	vie 02/10/26	sáb 03/10/26	49	LC[50%]
51	Preparar hojas de dat	4 días	mié 30/09/26	sáb 03/10/26	48	SR[50%]
52	Revisar coherencia SI	1 día	dom 04/10/26	dom 04/10/26	50;51	GM[50%];RP[50%]
53	HITO S07 — Entregal	0 días	dom 04/10/26	dom 04/10/26	52	RP[50%]
54	**SEMANA 08 — Adquisici**	**7 días**	**lun 05/10/26**	**dom 11/10/26**		
55	Cerrar cotizaciones y	2 días	lun 05/10/26	mar 06/10/26	53	SR[50%]
56	Gestionar compra, rec	5 días	mié 07/10/26	dom 11/10/26	55	SR[50%]
57	Detallar cámara, sopo	3 días	lun 05/10/26	mié 07/10/26	53	LC[50%]
58	Preparar piezas y cons	4 días	jue 08/10/26	dom 11/10/26	57	LC[50%];RP[50%]
59	Actualizar SRS, trazal	7 días	lun 05/10/26	dom 11/10/26	53	GM[50%]
60	HITO S08 — Entregal	0 días	dom 11/10/26	dom 11/10/26	56;58;59	RP[50%]



Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26

Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
61	**SEMANA 09 — Riesgos,**	**7 días**	**lun 12/10/26**	**dom 18/10/26**		
62	Realizar análisis de rie	2 días	lun 12/10/26	mar 13/10/26	60	GM[50%];RP[50%]
63	Cerrar medidas: corte	2 días	mié 14/10/26	jue 15/10/26	62	LC[50%];RP[50%]
64	Preparar plan de pruel	2 días	mié 14/10/26	jue 15/10/26	62	GM[50%]
65	Preparar configuració	2 días	vie 16/10/26	sáb 17/10/26	63	LC[50%]
66	Actualizar documenta	2 días	vie 16/10/26	sáb 17/10/26	63;64	SR[50%]
67	Revisión técnica de pr	1 día	dom 18/10/26	dom 18/10/26	65;66	RP[50%]
68	HITO S09 — Entregal	0 días	dom 18/10/26	dom 18/10/26	67	RP[50%]
69	**IV. IMPLEMENTAR Y VALIDA**	**21 días**	**lun 19/10/26**	**dom 08/11/26**		
70	**SEMANA 10 — Implemer**	**7 días**	**lun 19/10/26**	**dom 25/10/26**		
71	Montar calefactores, F	3 días	lun 19/10/26	mié 21/10/26	68	LC[50%];RP[50%]
72	Montar tablero, protec	3 días	jue 22/10/26	sáb 24/10/26	71	LC[50%];RP[50%]
73	Programar secuencia,	4 días	lun 19/10/26	jue 22/10/26	68	GM[50%]
74	Configurar HMI: consi	2 días	vie 23/10/26	sáb 24/10/26	73	GM[50%]
75	Registrar montaje y pr	6 días	lun 19/10/26	sáb 24/10/26	68	SR[50%]
76	Inspeccionar montaje	1 día	dom 25/10/26	dom 25/10/26	72;74;75	GM[50%];LC[50%];RP[50%]
77	HITO S10 — Entregal	0 días	dom 25/10/26	dom 25/10/26	76	RP[50%]
78	**SEMANA 11 — Integració**	**7 días**	**lun 26/10/26**	**dom 01/11/26**		
79	Verificar cableado, ais	1 día	lun 26/10/26	lun 26/10/26	77	LC[50%];RP[50%]
80	Comprobar lazo PT10	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26	79	LC[50%];RP[50%]
81	Integrar PLC–HMI–SS	1 día	mié 28/10/26	mié 28/10/26	80	LC[50%];RP[50%]
82	Verificar emergencia,	1 día	jue 29/10/26	jue 29/10/26	81	GM[50%];RP[50%]
83	Sintonizar PID y verifi	2 días	vie 30/10/26	sáb 31/10/26	82	GM[50%];LC[50%]
84	Consolidar plano conf	6 días	lun 26/10/26	sáb 31/10/26	77	SR[50%]
85	Revisar funcionamient	1 día	dom 01/11/26	dom 01/11/26	83;84	RP[50%]
86	HITO S11 — Entregal	0 días	dom 01/11/26	dom 01/11/26	85	RP[50%]
87	**SEMANA 12 — Pruebas p**	**7 días**	**lun 02/11/26**	**dom 08/11/26**		
88	Evaluar respuesta térr	2 días	lun 02/11/26	mar 03/11/26	86	GM[50%];LC[50%];RP[50%]
89	Corregir desviaciones	2 días	mié 04/11/26	jue 05/11/26	88	GM[50%];LC[50%];RP[50%]
90	Consolidar borrador d	4 días	lun 02/11/26	jue 05/11/26	86	SR[50%]



Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26

Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
91	Capacitar equipo y ens	1 día	vie 06/11/26	vie 06/11/26	89;90	SR[50%];GM[50%];LC[50%];
92	Reserva para continge	1 día	sáb 07/11/26	sáb 07/11/26	91	SR[50%];GM[50%];LC[50%];
93	Presentar y demostrar	1 día	dom 08/11/26	dom 08/11/26	92	SR[50%];GM[50%];LC[50%];
94	HITO S12 — Demostı	0 días	dom 08/11/26	dom 08/11/26	93	RP[50%]
95	**V. VERIFICAR, COMISIONAR**	**28 días**	**lun 09/11/26**	**dom 06/12/26**		
96	**SEMANA 13 — Verificaci**	**7 días**	**lun 09/11/26**	**dom 15/11/26**		
97	Revisar observaciones	1 día	lun 09/11/26	lun 09/11/26	94	GM[50%];RP[50%]
98	Inspeccionar instalaci	1 día	mar 10/11/26	mar 10/11/26	97	LC[50%];RP[50%]
99	Verificar PT100, trans	1 día	mié 11/11/26	mié 11/11/26	98	LC[50%];GM[50%]
100	Ejecutar I/O Check, L	1 día	jue 12/11/26	jue 12/11/26	99	LC[50%];RP[50%]
101	Probar parada, limitad	1 día	vie 13/11/26	vie 13/11/26	100	RP[50%];LC[50%]
102	Corregir hallazgos y re	1 día	sáb 14/11/26	sáb 14/11/26	101	LC[50%];RP[50%]
103	Revisar dossier de pre	1 día	dom 15/11/26	dom 15/11/26	102	RP[50%];SR[50%]
104	HITO S13 — Precomi	0 días	dom 15/11/26	dom 15/11/26	103	RP[50%]
105	**SEMANA 14 — Ensayos**	**7 días**	**lun 16/11/26**	**dom 22/11/26**		
106	Ensayar calentamient	2 días	lun 16/11/26	mar 17/11/26	104	LC[50%];RP[50%]
107	Ensayar con carga rep	2 días	mié 18/11/26	jue 19/11/26	106	LC[50%];GM[50%]
108	Evaluar repetibilidad, t	1 día	vie 20/11/26	vie 20/11/26	107	GM[50%];RP[50%]
109	Corregir desviaciones	1 día	sáb 21/11/26	sáb 21/11/26	108	LC[50%];RP[50%]
110	Ejecutar FAT del prot	1 día	dom 22/11/26	dom 22/11/26	109	RP[50%];GM[50%]
111	HITO S14 — FAT ace	0 días	dom 22/11/26	dom 22/11/26	110	RP[50%]
112	**SEMANA 15 — Comision**	**7 días**	**lun 23/11/26**	**dom 29/11/26**		
113	Revisar condiciones d	1 día	lun 23/11/26	lun 23/11/26	111	RP[50%];LC[50%]
114	Realizar puesta en ma	2 días	mar 24/11/26	mié 25/11/26	113	LC[50%];RP[50%]
115	Validar requisitos y an	1 día	jue 26/11/26	jue 26/11/26	114	GM[50%];RP[50%]
116	Cerrar incidencias y re	2 días	vie 27/11/26	sáb 28/11/26	115	LC[50%];RP[50%]
117	Consolidar evaluación	2 días	vie 27/11/26	sáb 28/11/26	115	GM[50%];SR[50%]
118	Revisar validación fina	1 día	dom 29/11/26	dom 29/11/26	116;117	RP[50%];GM[50%]
119	HITO S15 — Comisio	0 días	dom 29/11/26	dom 29/11/26	118	RP[50%]
120	**SEMANA 16 — Documen**	**7 días**	**lun 30/11/26**	**dom 06/12/26**		



Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26


Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
121	Actualizar planos As-E	2 días	lun 30/11/26	mar 01/12/26	119	LC[50%];SR[50%]
122	Finalizar manuales de	2 días	lun 30/11/26	mar 01/12/26	119	GM[50%];RP[50%]
123	Consolidar informe, ar	1 día	mié 02/12/26	mié 02/12/26	121;122	SR[50%];GM[50%]
124	Capacitar operadores	1 día	mié 02/12/26	mié 02/12/26	121;122	RP[50%];LC[50%]
125	Revisión cruzada del e	1 día	jue 03/12/26	jue 03/12/26	123;124	SR[50%];RP[50%]
126	Reserva para correcci	1 día	vie 04/12/26	vie 04/12/26	125	SR[50%];LC[50%]
127	Presentar proyecto, er	1 día	sáb 05/12/26	sáb 05/12/26	126	SR[50%];GM[50%];LC[50%];
128	Registrar acta de cierr	1 día	dom 06/12/26	dom 06/12/26	127	SR[50%];RP[50%]
129	HITO S16 — Proyecto	0 días	dom 06/12/26	dom 06/12/26	128	RP[50%]




Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26

Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite

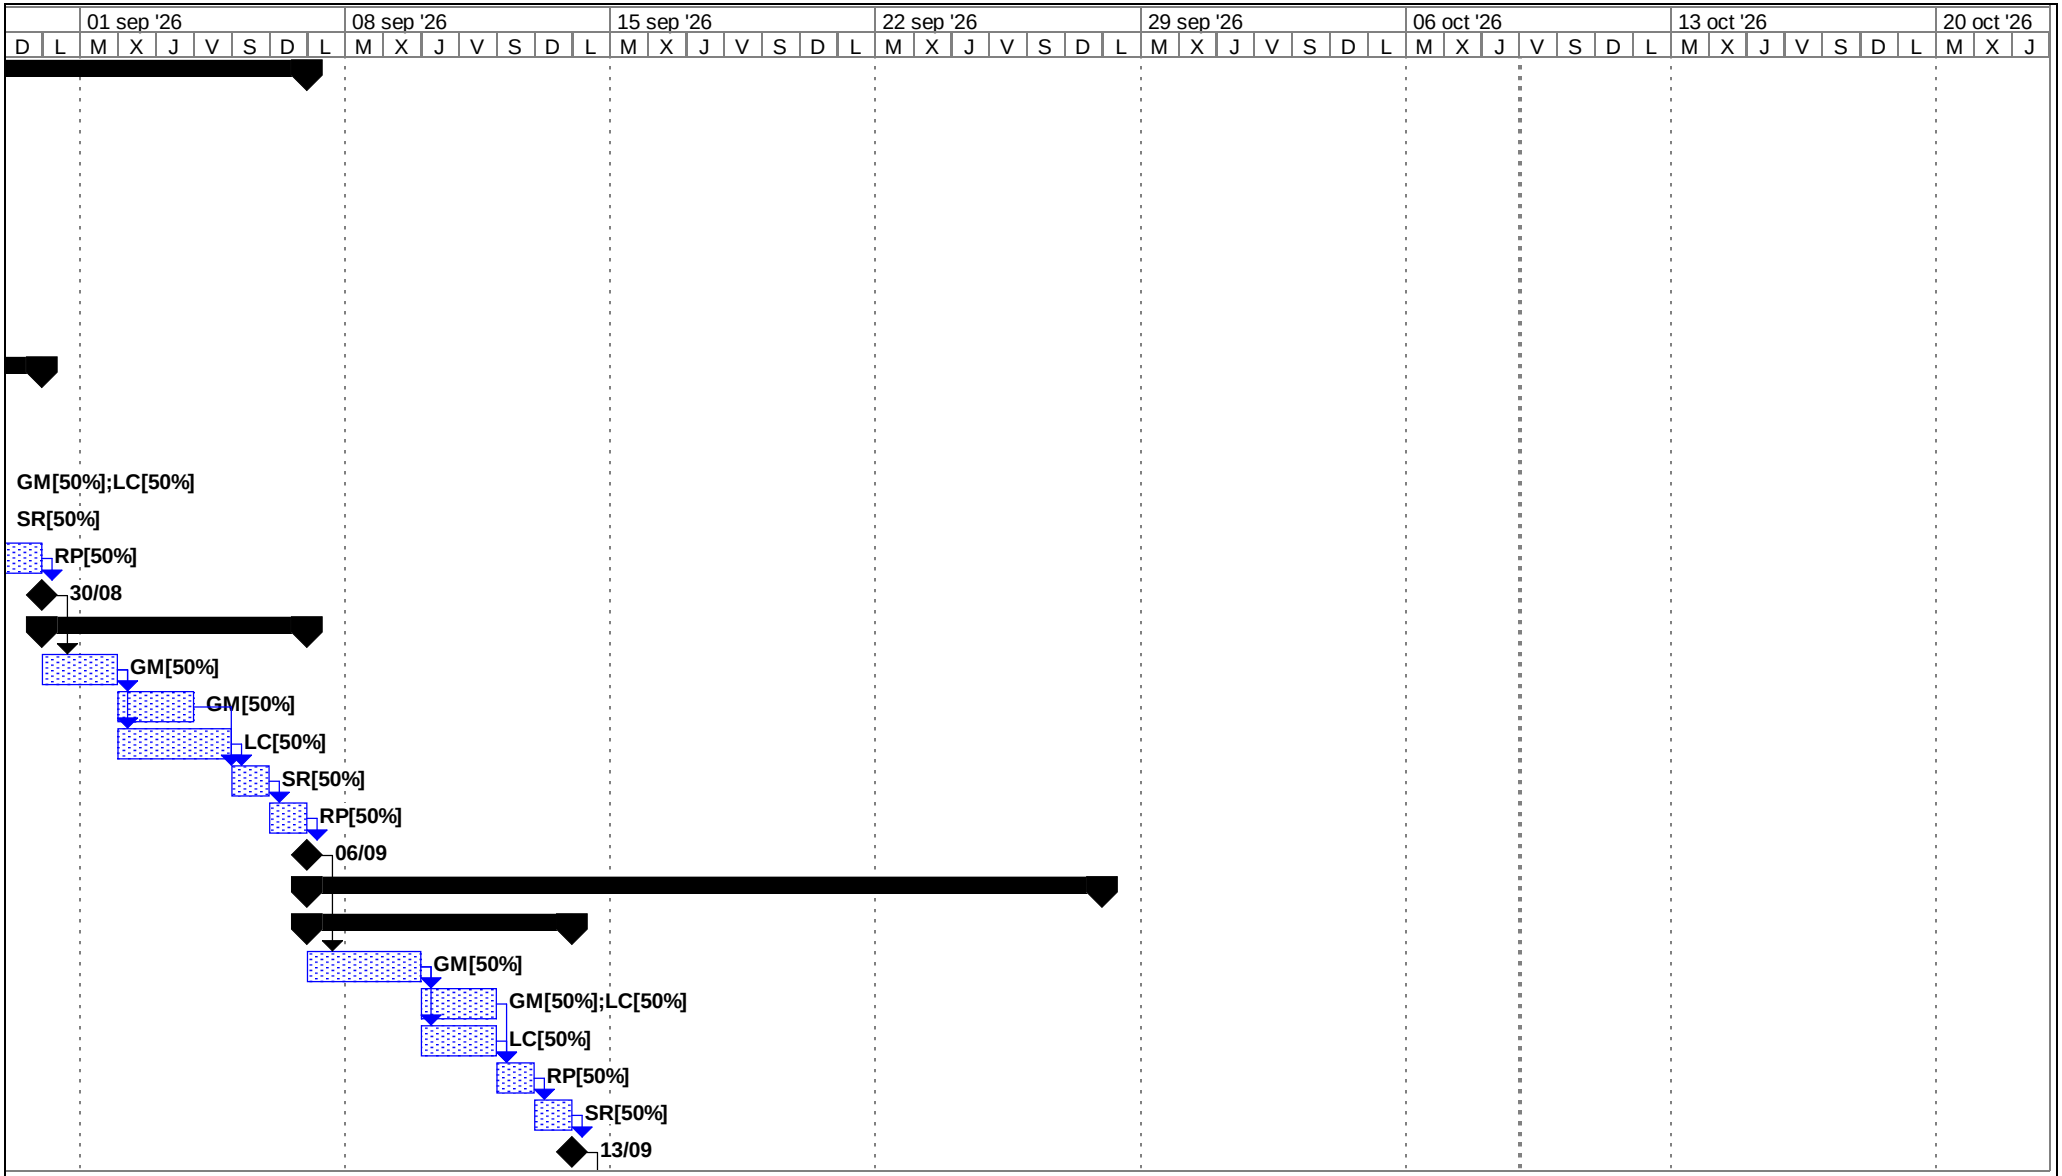


Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

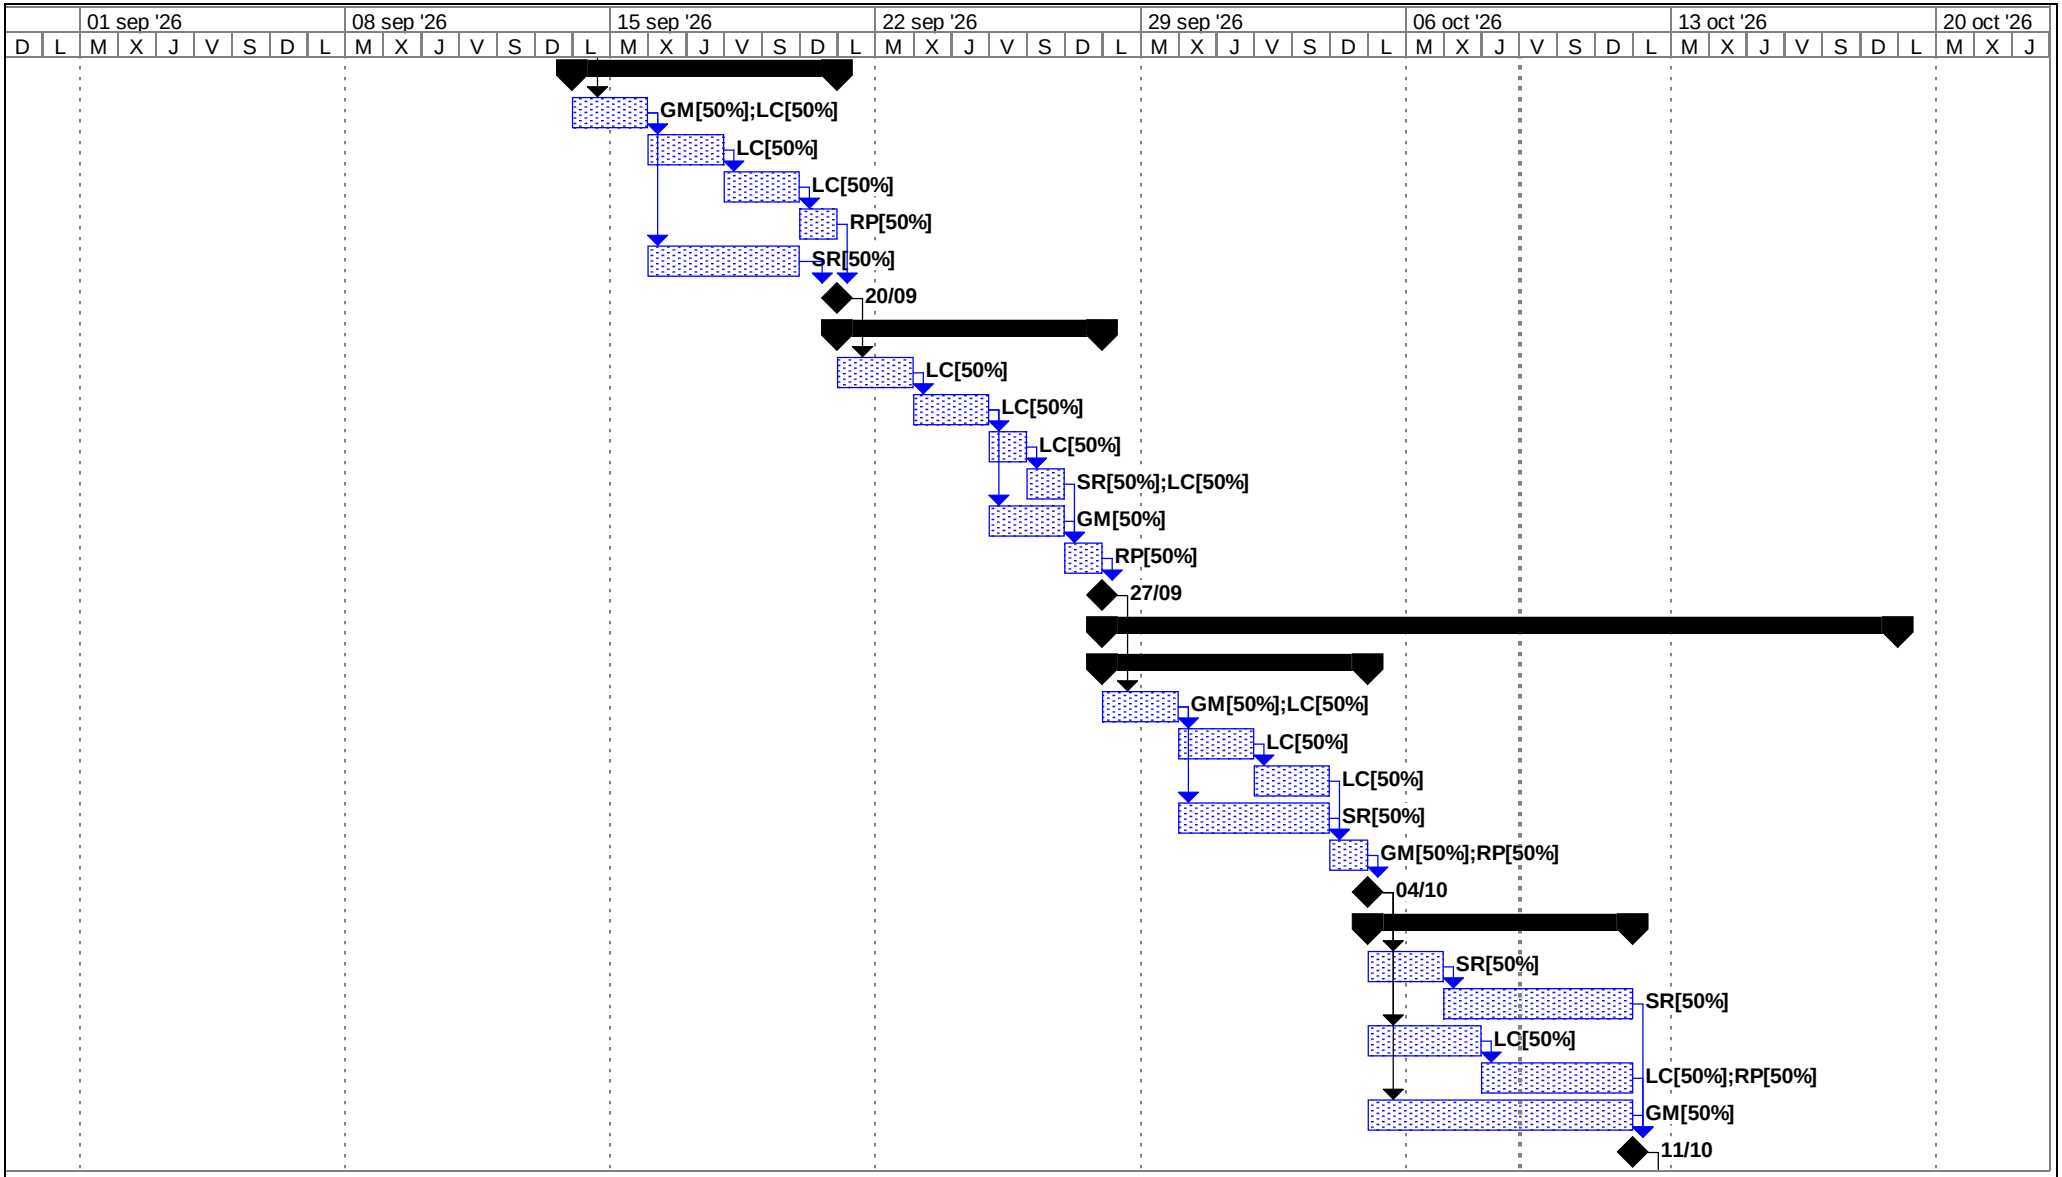


Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

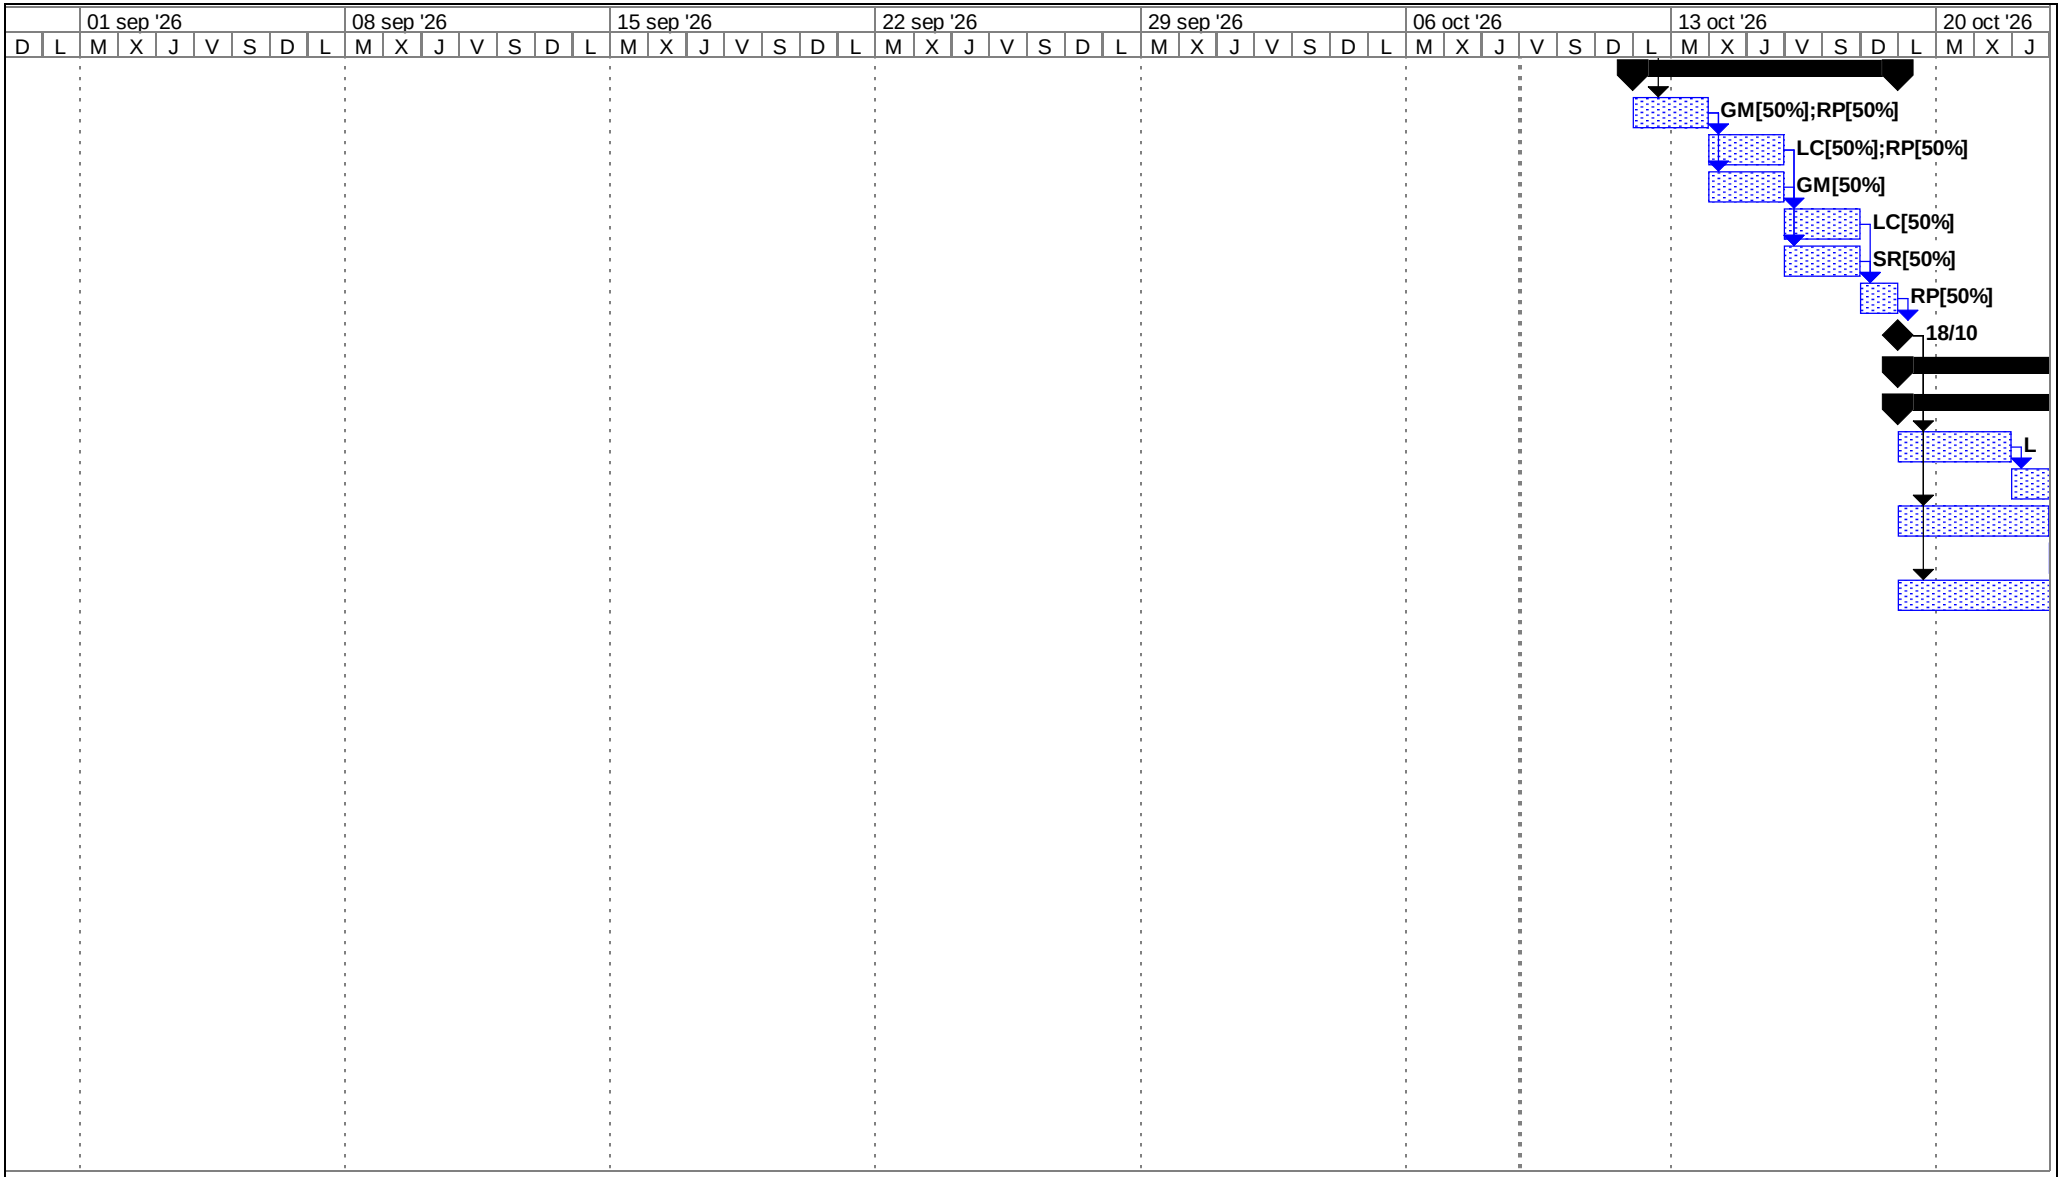


Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

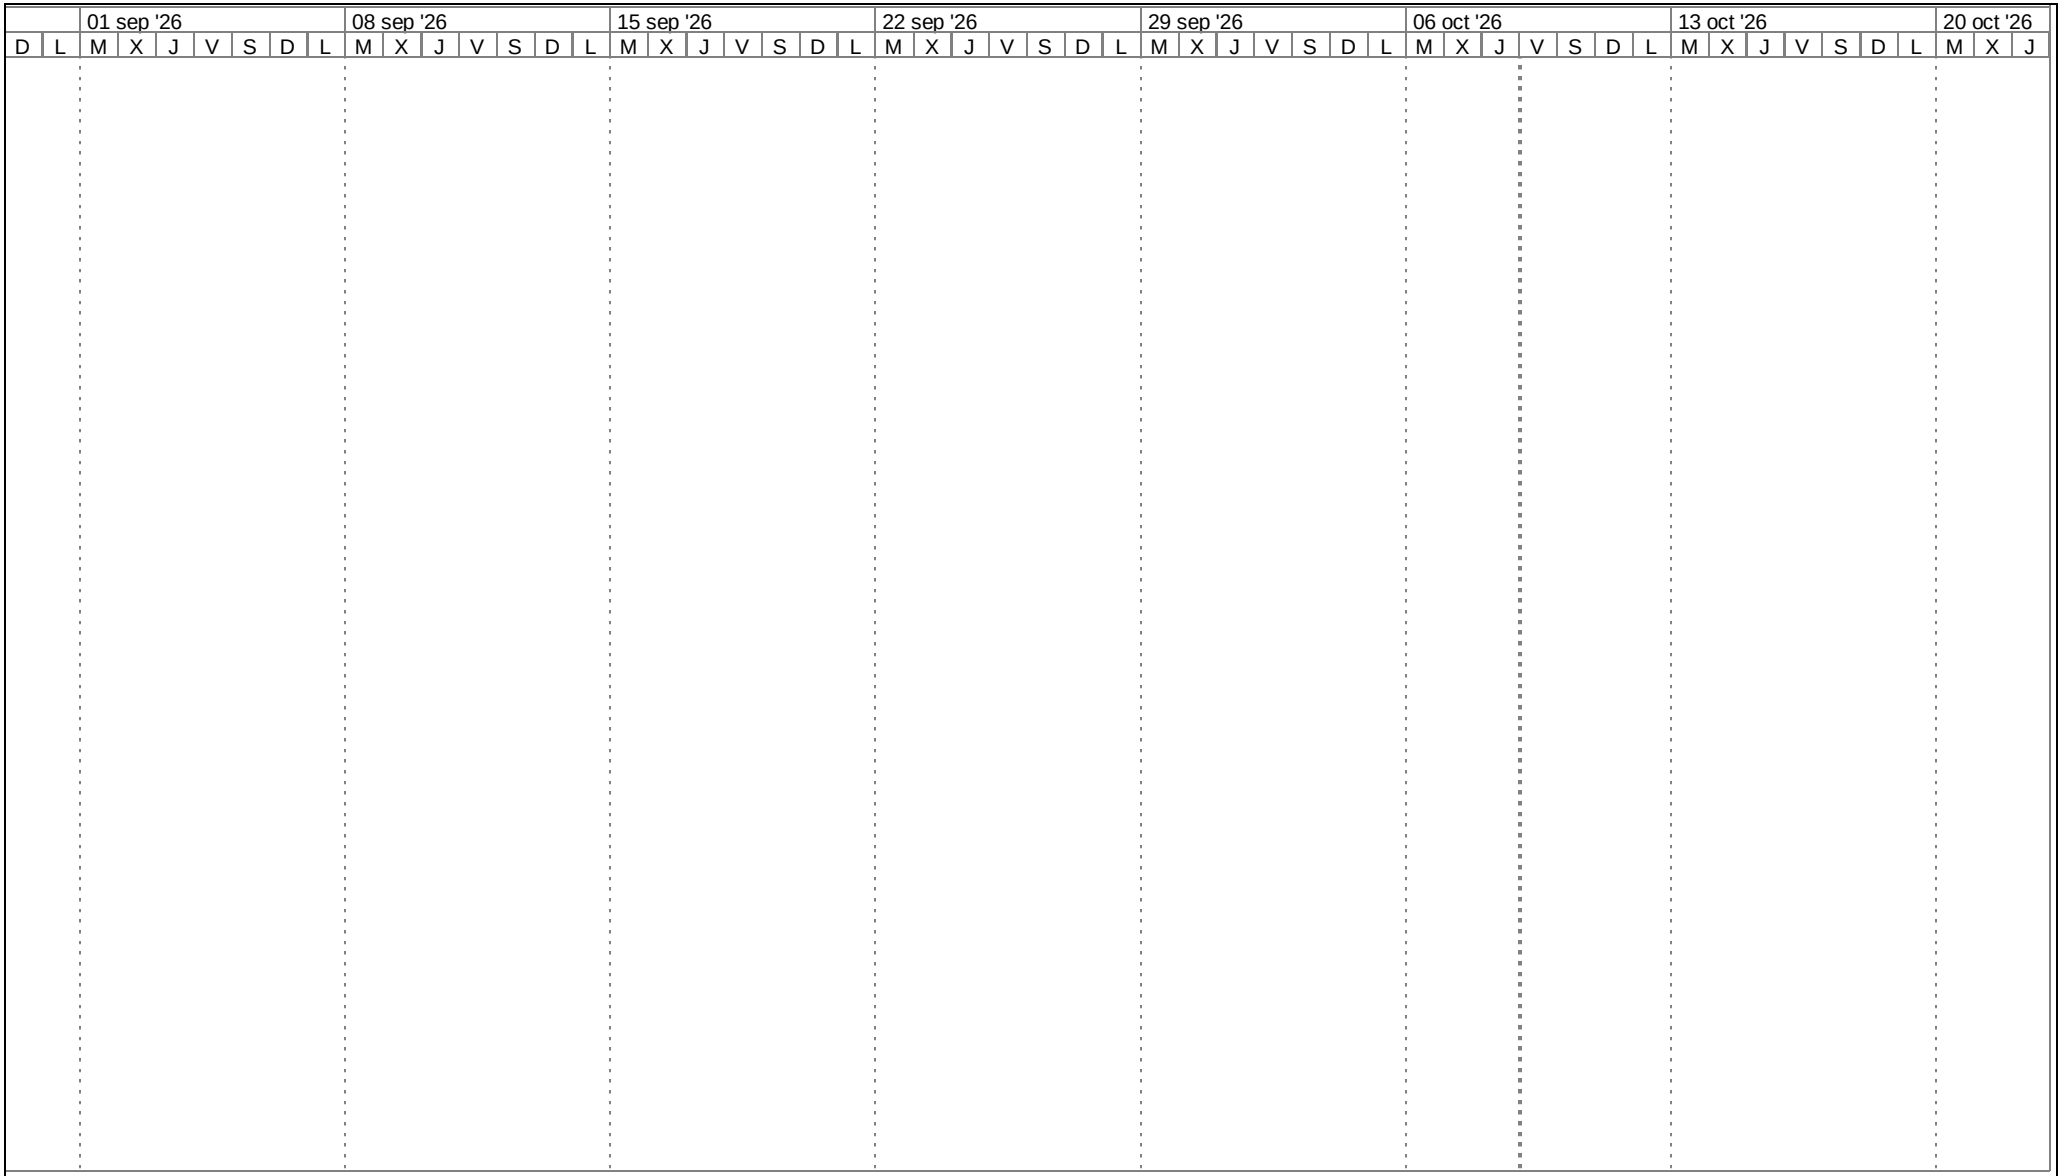


Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26




Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26


Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite

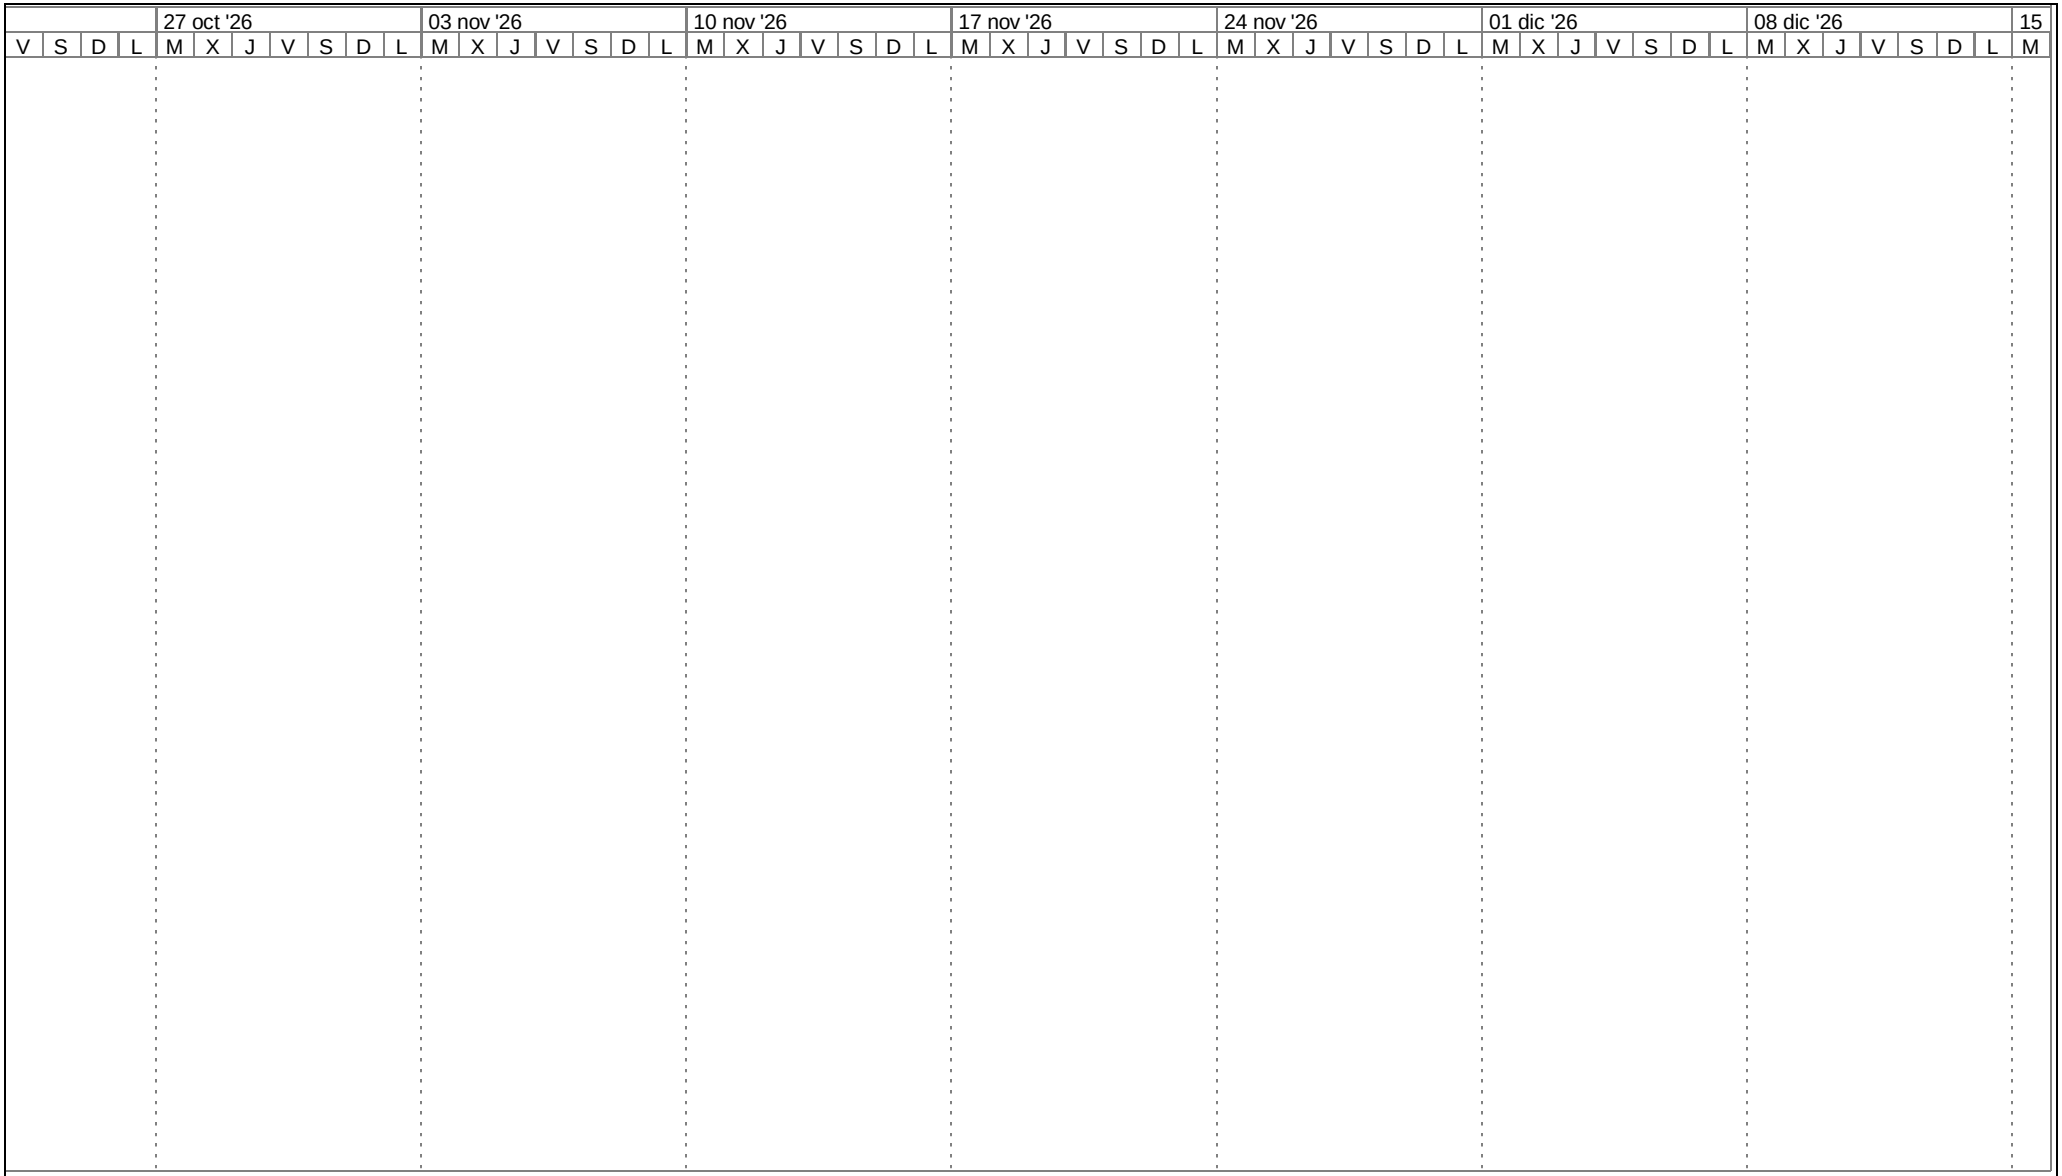

Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26


Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite

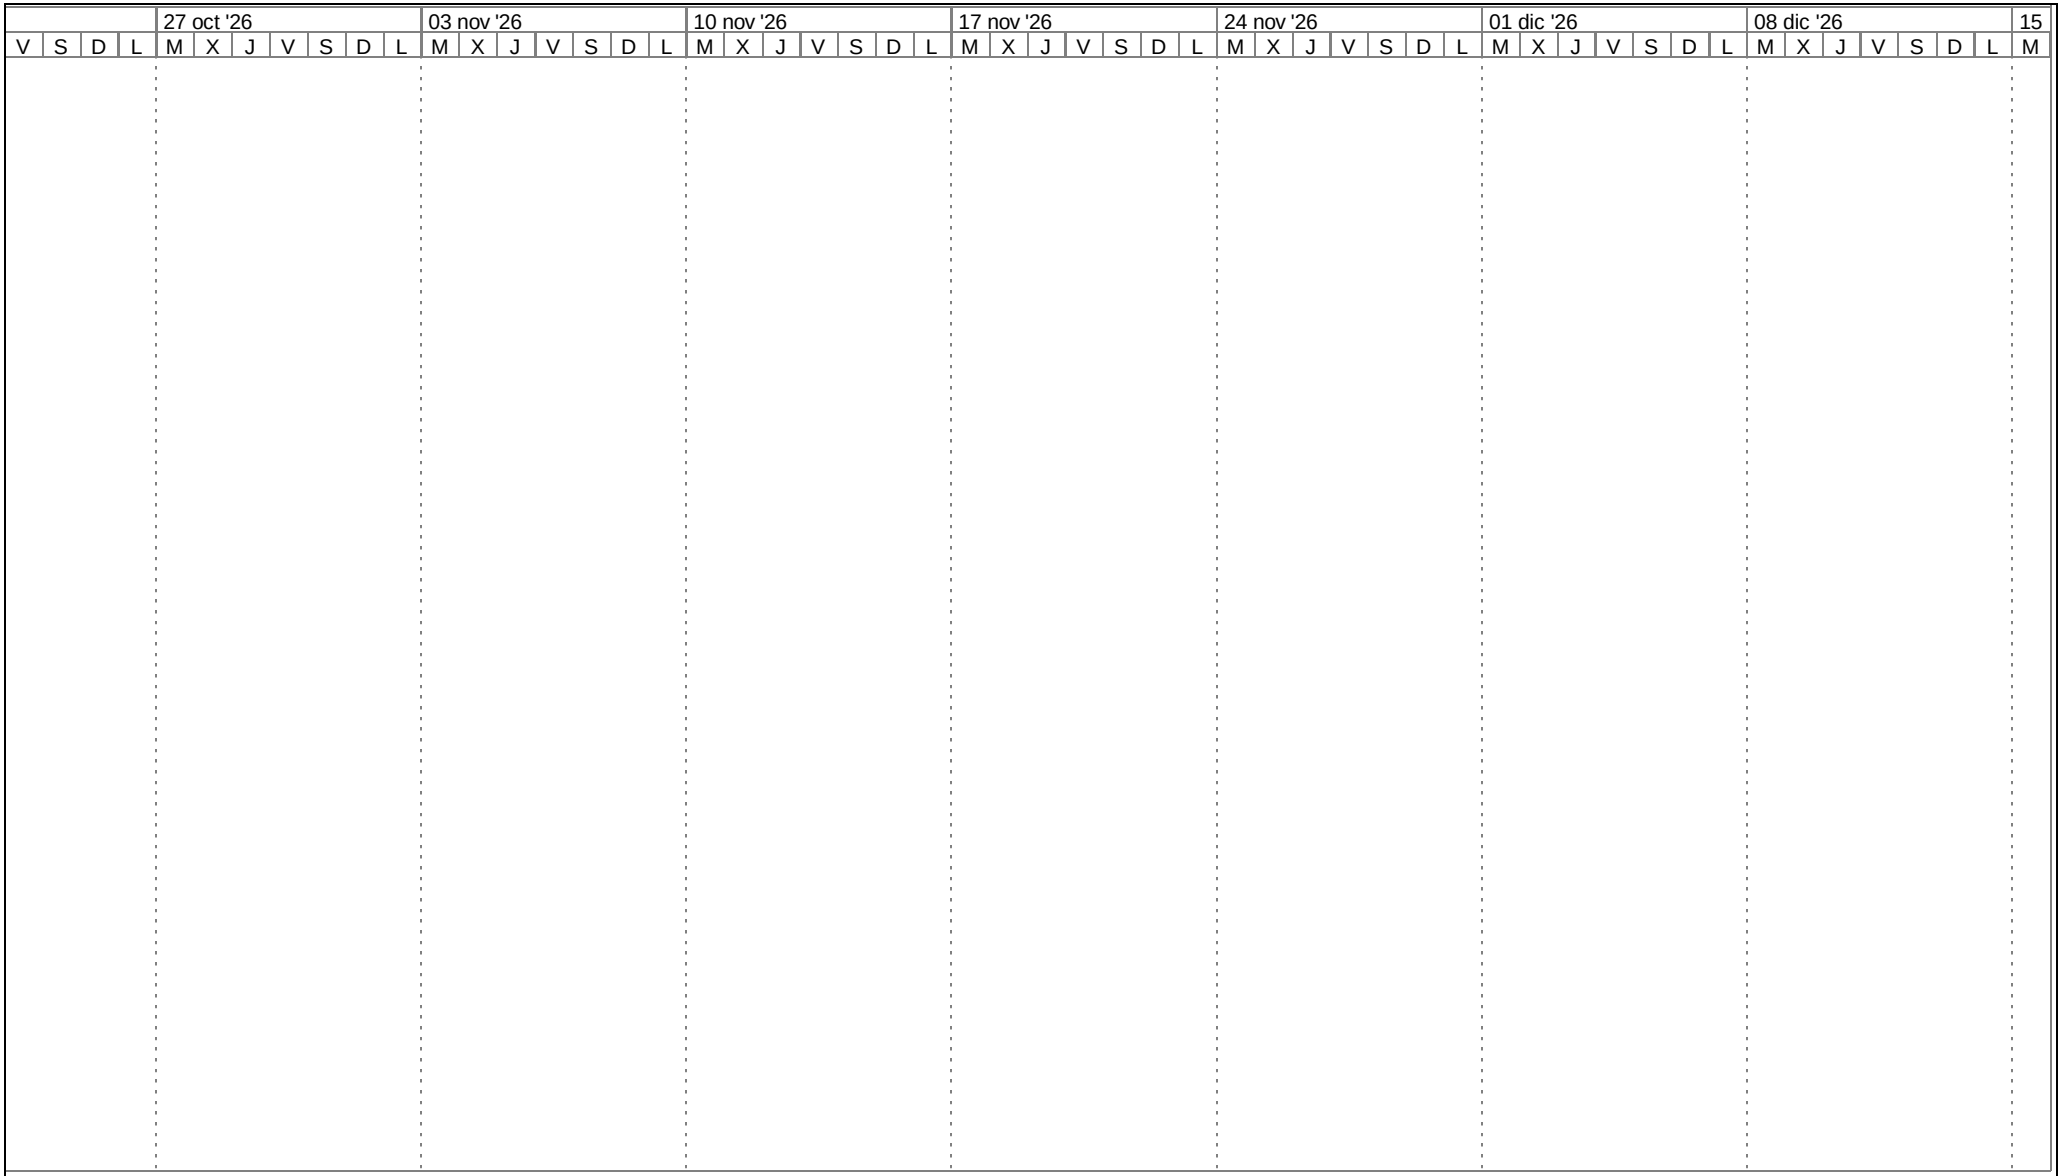
27 oct '26
03 nov '26
10 nov '26
17 nov '26
24 nov '26
01 dic '26
08 dic '26
15
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

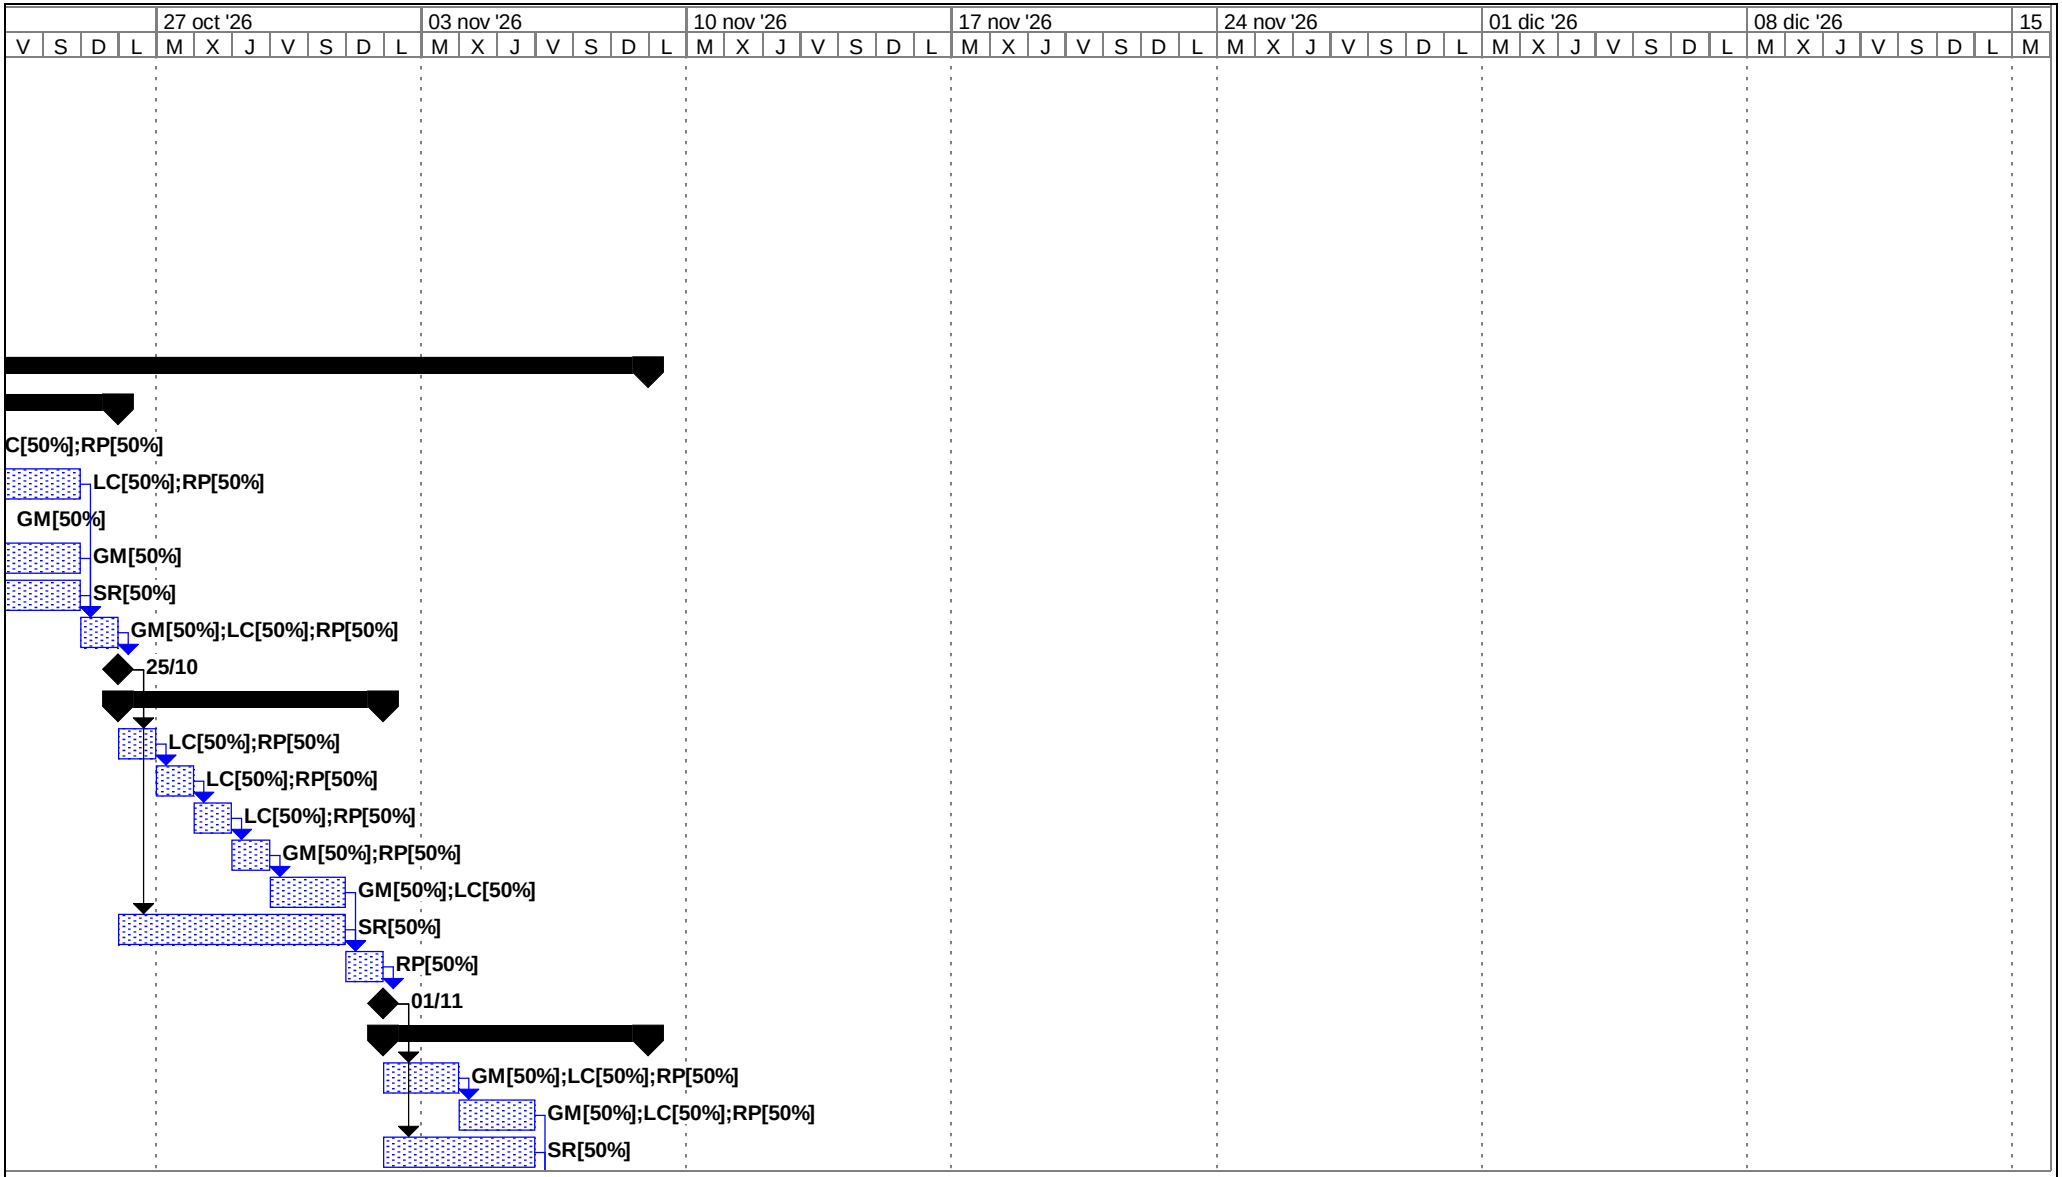


Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

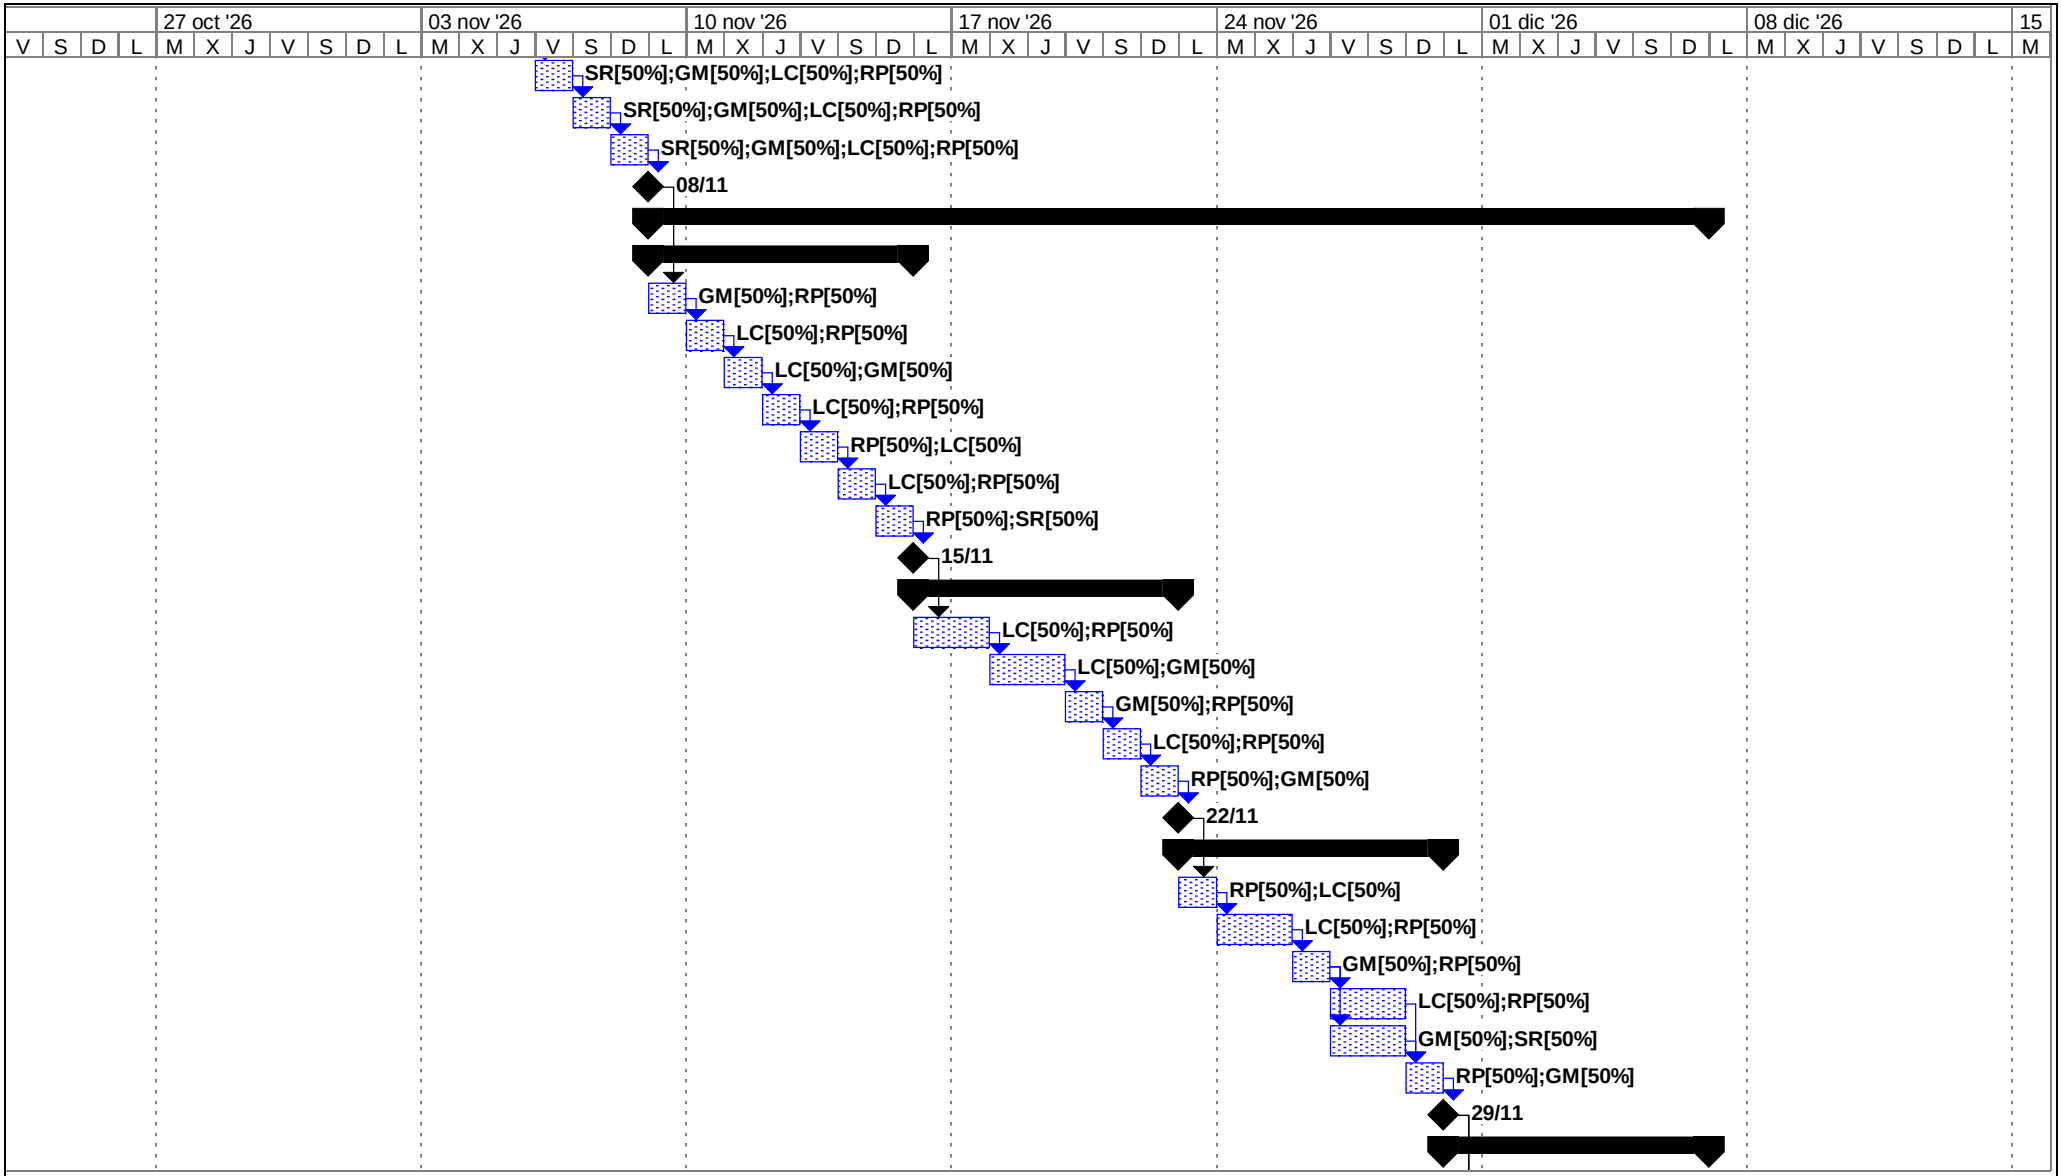

Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

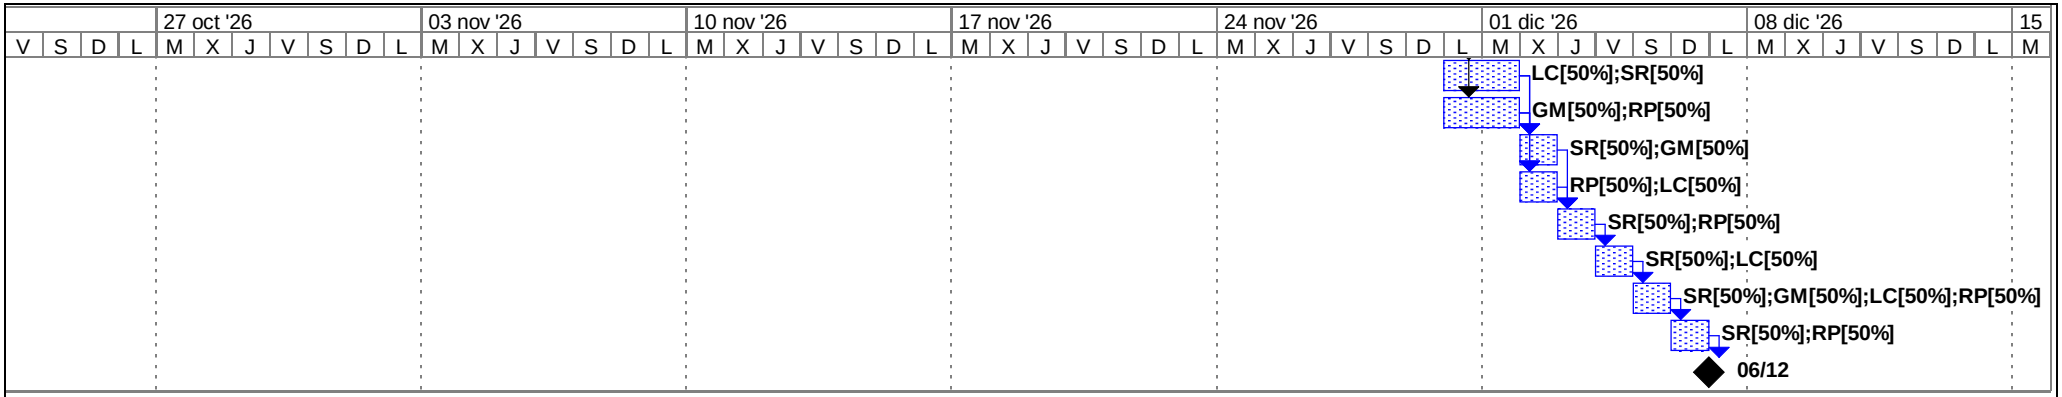

Proyecto: Horno_electrico_Tecsu
Fecha: vie 09/10/26

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	
